

Sprint 3 planning

Dragon Slayers



Opleiding: HBO-ICT – Business IT Management
Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Docenten:
Philip Lafeber
Jelle Kaptein

Teamleden:
Ryan James Tiangco
Adel Al-Rammah
Amira El Hafidi
Noura Ezzafzafi

Contact:
noura.ezzafzafi@hva.nl
amira.el.hafidi@hva.nl
ryan.james.tiangco@hva.nl
adel.al.rammah@hva.nl

Datum: 23 maart 2026

Gerealiseerde issues in sprint 2

Completed	10	29
(closed)		
Onderzoek Robot Framework	#50 Backend Onderzoek	3 Done
Logo aanpassen	#49 Ontwerpen	2 Done
BPMN verbeteren	#47 Feedback	2 Done
Plan van Aanpak verbeteren en afronden	#46 Documentation Feedback	3 Done
BPMN Diagram opstellen	#44 Analyseren Onderzoek Ontwerpen	5 Done
Story Points / Weight Tabel opstellen	#43 Organisatieprocessen Planning Scrum	2 Done
Use Case Diagram	#42 Onderzoek Ontwerpen	3 Done
PI Planning uitwerken	#41 Documentation Planning Scrum	5 Done
Feedback-analyse document maken	#28 Analyseren Documentation	2 Done
Testscenario's uitschrijven	#26 Documentation Testing	2 Done

In sprint 2 hebben we ons vooral gericht op analyseren, ontwerpen en voorbereidend onderzoek. Alle geplande user story's zijn succesvol afgerond, waardoor een stevige basis gelegd voor de ontwikkelsprints die volgen.

Tijdens deze sprint zijn onder andere het BPMN-diagram, het use-case-diagram en de feedbackanalyse uitgewerkt en afgerond. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het Robot Framework en zijn de eerste ontwerpkeuzes, zoals het logo en de structuur van het plan van aanpak, definitief vastgesteld.


Ook is er een storypoint/weighttabel opgesteld, wat belangrijk is voor consistente issues in de komende sprints.

Burndown en burnup chart van afgelopen sprint


Sprint 2: Ontwerpen, Visualiseren en Gebruikersfeedback

Display by Count Weight

Burndown chart

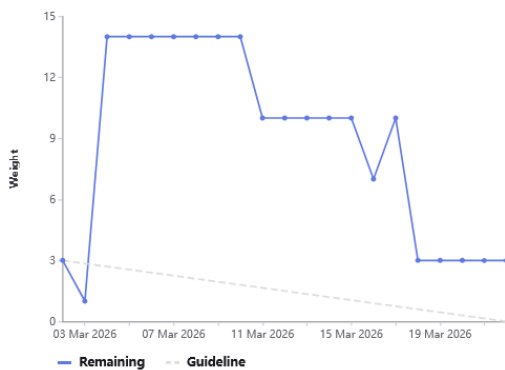

Burnup chart

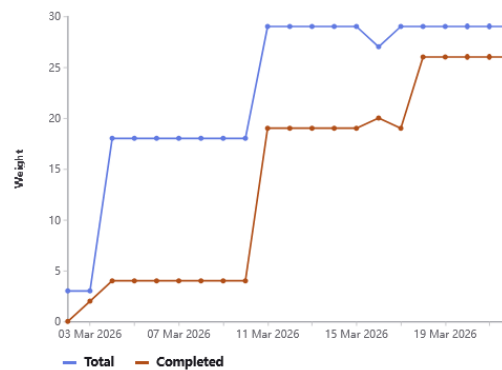

Dit
is
de

burndown chart van de totale hoeveelheid weights in sprint 2. In GitLab werken we nog steeds met weights, labels, assignees en due dates. Uit de burndownchart blijkt dat het werk niet gelijkmatig over de sprint is afgebouwd. De grafiek laat meerdere stijgingen en dalingen zien, en een groot deel van de taken is pas in de laatste dagen zichtbaar als afgerond.

In de burnupchart is te zien dat de hoeveelheid afgerond werk vooral vanaf 11 maart sterk toenam. Dit laat zien dat veel issues laat in de sprint op 'Done' zijn gezet op het issuebord.

Deze bevinding sluit aan op onze retro-punten: we werkten soms te veel last-minute. Alles werd wel op tijd afgerond, maar we zetten afgeronde taken niet altijd direct op 'Done'. Daardoor lijkt het in de burndownchart alsof werk pas laat is afgerond. In sprint 3 willen we dit verbeteren door duidelijker te plannen en taken meteen te updaten, zodat de burndown gelijkmatiger verloopt en er minder pieken zijn aan het einde van de sprint.

Sprint 3 doel

In sprint 3 willen we de eerste werkende basis van onze applicatie bouwen. Dat betekent dat een gebruiker een project kan aanmaken, openen en opslaan, dat er een visuele editor beschikbaar is om teststappen te bouwen, en dat deze stappen kunnen worden omgezet naar code. Hiermee ontstaat voor het eerst een complete keten: van projectbeheer, naar blokken slepen, naar gegenereerde code.

Het doel van deze sprint is dus om een functionele basisversie neer te zetten die nog niet volledig is, maar wel laat zien hoe de applicatie straks gaat werken. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking richting de MVP.

Verwerking van de feedback

In sprint 3 hebben we de feedback van de planning van sprint 2 verwerkt door onze planning duidelijker te koppelen aan het sprintdoel.

We hebben de user story's per slice uitgewerkt en die zijn direct verbonden aan het sprintdoel. Hierdoor wordt duidelijk hoe de user story's samen de eerste basis van de applicatie opleveren.

Afstemming met de opdrachtgever


In sprint 2 hebben we met de opdrachtgever afgesproken dat we elke woensdag een feedbackgesprek houden. We hebben de user story's voor deze sprint al ingepland, maar laten deze eerst controleren door de opdrachtgever om te bevestigen dat de gekozen slices en functionaliteiten aansluiten bij de verwachtingen.

Na deze afstemming starten we direct met de uitvoering van de sprinttaken. Door deze vaste feedbackmomenten verwachten we sneller duidelijkheid te hebben, tijdig bijgestuurd te worden en minder aannames te doen.

Geplande issues voor de sprint

Voor sprint 3 hebben we user story's gepland die gericht zijn op het bouwen van de eerste basisfunctionaliteit van de applicatie. In grote lijnen werken we aan stories rondom projectbeheer, het opzetten van de editor en het genereren van code. Deze stories vormen samen de eerste stap richting een werkende versie van het systeem.

Resterende backlog

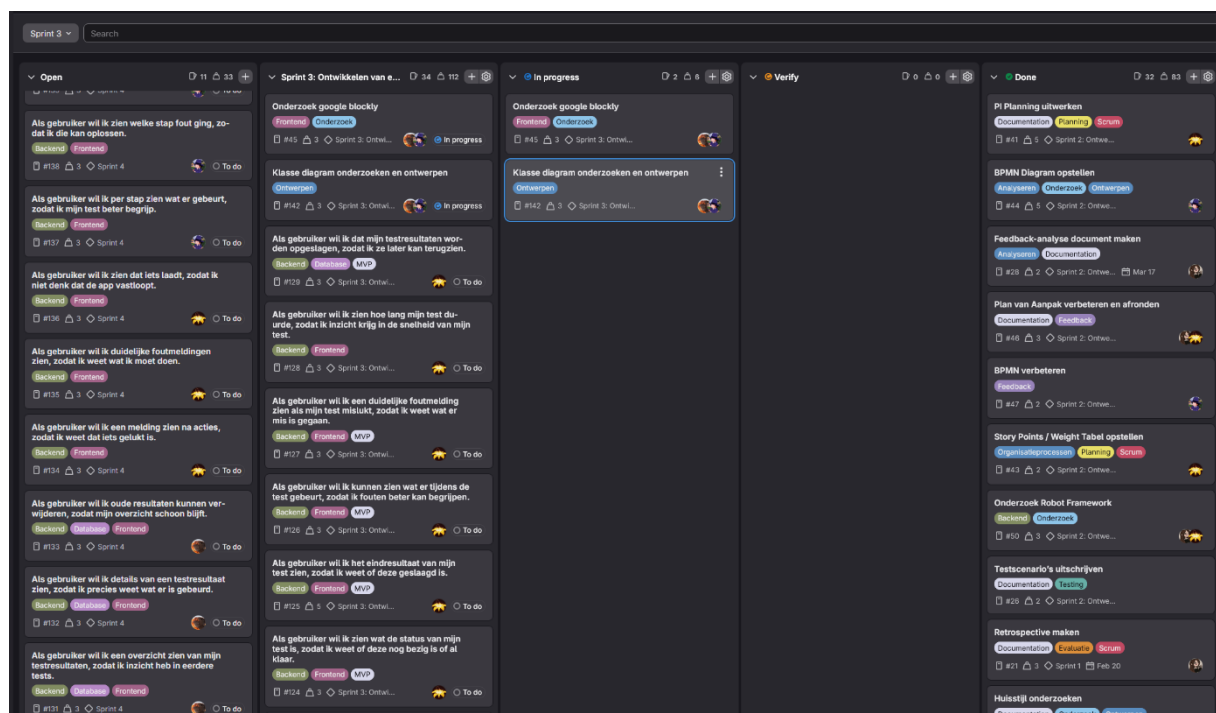

Dit is onze backlog. Tijdens sprint 2 hebben we alle geplande issues succesvol kunnen afronden, met uitzondering van het onderzoek naar Google Blockly. Deze taak bleek meer tijd te vragen dan vooraf ingeschat, waardoor we hebben besloten om deze door te schuiven naar milestone sprint 3.

Het onderzoek naar Google Blockly vormt op dit moment dus onze enige resterende backlog-item, en zal in deze sprint verder worden opgepakt.
