

Sprint 4 planning

Dragon Slayers



Opleiding: HBO-ICT – Business IT Management
Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Docenten:
Philip Lafeber
Jelle Kaptein

Teamleden:
Ryan James Tiangco
Adel Al-Rammah
Amira El Hafidi
Noura Ezzafzafi

Contact:
noura.ezzafzafi@hva.nl
amira.el.hafidi@hva.nl
ryan.james.tiangco@hva.nl
adel.al.rammah@hva.nl


Datum: 13 april 2026

Gerealiseerde issues in sprint 3

In de afgelopen sprint hebben we niet alleen nagedacht over onze applicatie, maar ook heel veel geprogrammeerd. We hebben de basis van de app gebouwd zodat alles technisch werkt.

Deze onderdelen hebben we nu afgerond:

- De database: We hebben alle benodigde tabellen opgezet voor projecten, gebruikers en testresultaten, gebaseerd op onze ERD en EERD.
- Projecten aanmaken: Het is nu mogelijk om in de app een nieuw testproject te starten, een naam te geven en op te slaan.
- De Blockly-editor: De visuele editor staat klaar. Gebruikers kunnen blokken slepen en met elkaar verbinden (drag-and-drop).
- Verbinding: De frontend (website) communiceert nu veilig met de backend (database) via een API-sleutel.

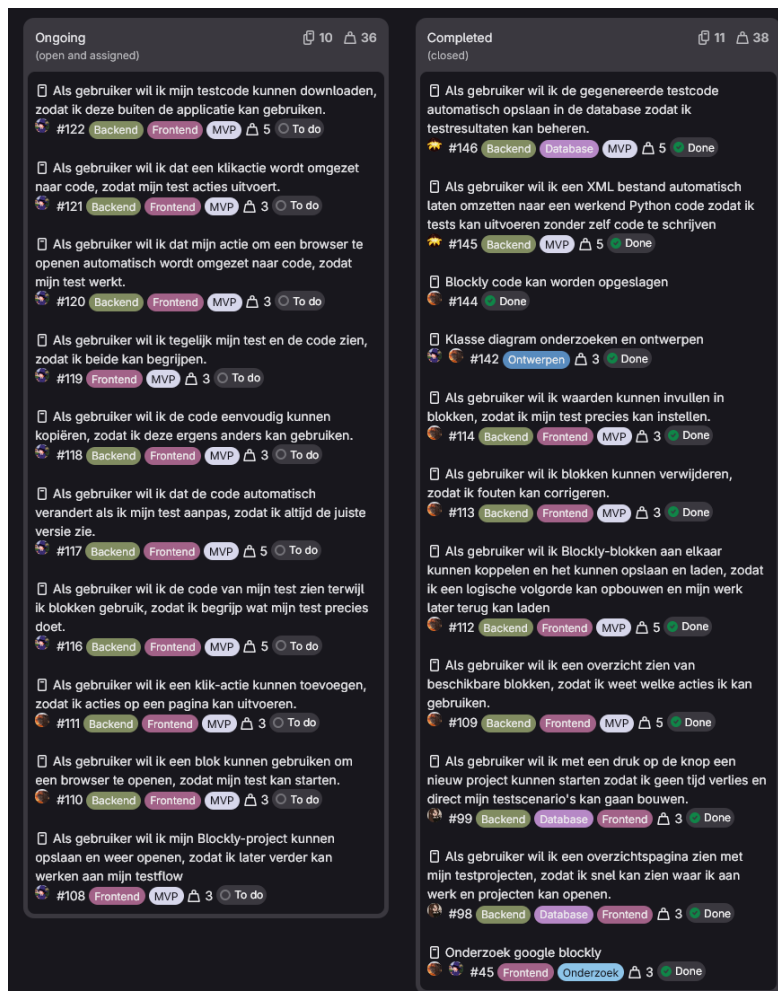


Door persoonlijke omstandigheden kon een teamgenoot zijn taken niet afmaken. Wij vangen dit als team op en maken dit in Sprint 4 af.

Burndown en burnup chart van afgelopen sprint

Deze grafieken laten zien dat we in sprint 3 vooral hebben gefocust op technisch werk.

- Punten: We hebben deze sprint in totaal 43 story points afgerond.
- Voortgang: De grafiek laat zien dat de meeste punten in de laatste week zijn behaald. Dit komt doordat de techniek en de databaseverbindingen toen gereed waren.
- Resultaat: Alle 12 taken zijn afgerond, waardoor de basis van ons prototype nu staat.

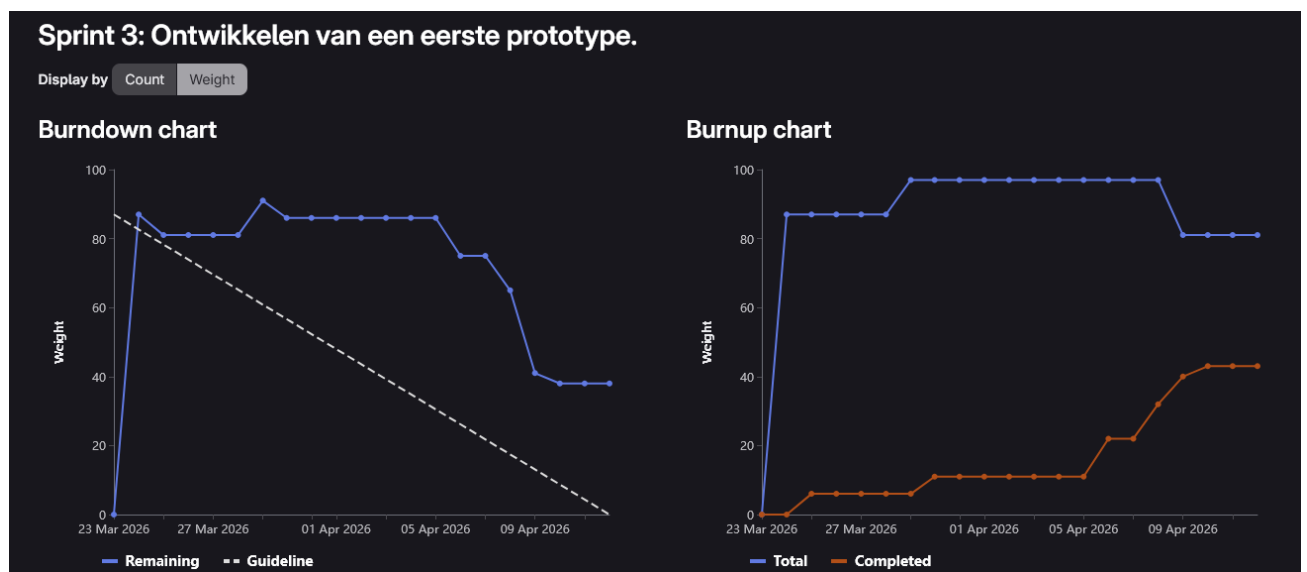


Geplande user stories voor sprint 4


In sprint 4 bouwen we verder op de technische basis die in sprint 3 is gelegd. We richten ons nu meer op het verder uitbreiden van de functionaliteiten.

De geplande user stories van sprint 4 richten zich op het opslaan van testprojecten, het openen van bestaande projecten, het uitvoeren van tests en het exporteren van testprojecten.

Op ons issue-bord is te zien dat een deel van de stories nu nog op 'to do' staat en een kleiner deel al 'in progress' is.

De issues die 'in progress' staan, zijn we al mee begonnen. De issues die nog op 'to do' staan, zijn vooraf ingepland en voorzien van labels, milestones en story points (weights). Hierdoor hebben we een duidelijk overzicht van de werkzaamheden binnen de sprint en kunnen we gericht werken aan de geplande functionaliteiten.

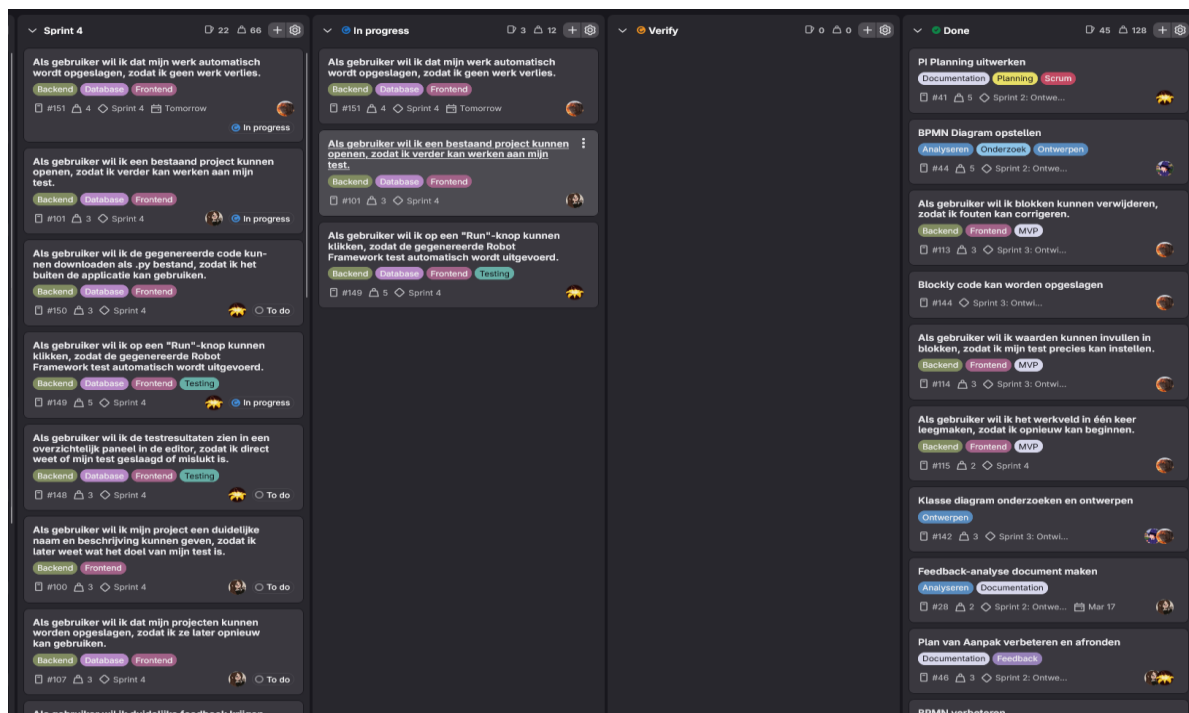

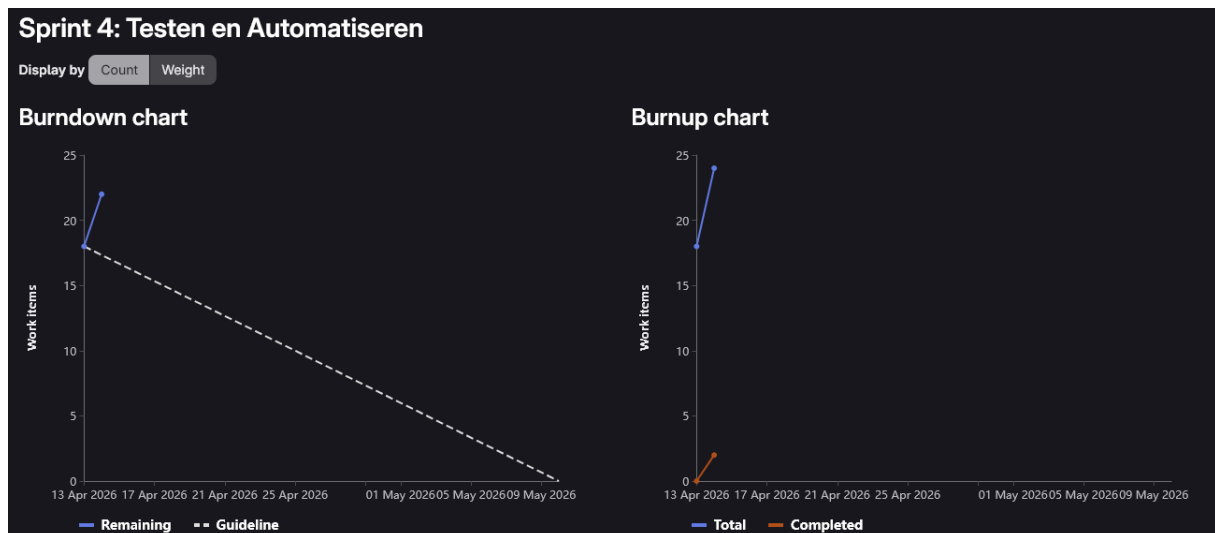

De grafieken laten zien dat sprint 4 nog in een vroeg stadium zit. Daardoor is er nog weinig afgerond en staat het meeste werk nog open.

Er staan op dit moment 22 work-items in de sprint waarvan er 2 al zijn afgerond. Vandaar dat de oranje lijn al stijgt in de grafiek.

De verwachting is dat de voortgang sneller zichtbaar wordt in de sprint, omdat de basis al staat. Hierdoor kunnen we in minder tijd meer functionaliteiten bouwen en sneller issues afronden

Sprint 4 doel

Ons doel voor Sprint 4 is om de applicatie echt werkend te maken voor de gebruiker. We gaan ons focussen op de volgende punten:

- Testen en uitvoeren: Het kunnen draaien van de testen en het uitvoeren van de code die uit de blokken komt.
- Inlogpagina: Het maken van een inlogpagina zodat gebruikers veilig toegang hebben.
- Blokken beheren: Het categoriseren van de blokken zodat ze makkelijk te vinden zijn.
- Uitgebreide library: Het toevoegen van een grotere verzameling aan blokken, zodat er meer verschillende acties getest kunnen worden.
- Opslaan en downloaden: Zorgen dat je testcases kunt opslaan in de database en kunt downloaden om ze buiten de app te gebruiken.

Resterende backlog

Door persoonlijke omstandigheden van een teamgenoot zijn er nog een paar taken blijven liggen. We hebben dit werk nu eerlijk verdeeld over de rest van het team. We pakken deze punten direct aan het begin van Sprint 4 op. Hierdoor voorkomen we vertraging en gaat ons project zonder problemen door.

